

**BANDO PER LA RIQUALIFICAZIONE E  
LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE**

**PROGETTO “TOP METRO”  
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO**

**Relazione di Monitoraggio  
01 gennaio 2020 – 30 giugno 2020**

## 1. DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

### **Gli obiettivi del progetto**

Il progetto ToP Metro della Città metropolitana di Torino (CMT) è costituito da un insieme interrelato ed integrato di interventi finalizzati alla riqualificazione delle periferie e al miglioramento della sicurezza del territorio. Il progetto si inserisce all'interno della visione di sviluppo delineata dal Piano strategico metropolitano il cui obiettivo generale è quello di una "Città della qualità", intesa quale luogo coeso, sano, sicuro e piacevole in cui vivere.

Gli interventi previsti hanno come obiettivo comune quello di concorrere all'integrazione delle diverse parti del territorio metropolitano, al miglioramento della coesione sociale, alla rivitalizzazione e alla crescita economica diffusa nelle periferie. In particolare, il progetto ToP Metro intende essere un primo passo concreto per superare la dicotomia tra centro e periferia e per dotare il territorio metropolitano della capacità di prepararsi al futuro, governando le trasformazioni in una logica di crescita competitiva, in coerenza con la riforma "Delrio" che considera le città metropolitane quali principali motori di sviluppo del Paese.

Attraverso la rigenerazione del tessuto urbano (aree costruite residenziali, aree verdi, spazi pubblici di aggregazione e incontro, recupero e riuso di aree produttive dismesse), incentivi alle imprese, miglioramento dei servizi per la collettività, misure per la prevenzione e l'accrescimento della sicurezza (sia in termini di contrasto ai fenomeni di criminalità, sia come contrasto all'inquinamento e al rischio ambientale), si intende migliorare la qualità della vita della popolazione e il grado di resilienza del territorio.

### **L'inquadramento urbanistico e i profili di coerenza del progetto**


La Città di Torino presenta un tessuto urbano continuo e strettamente connesso ai comuni confinanti della prima cintura. Il territorio in cui l'insediamento si sviluppa presenta caratteristiche morfologiche molto diverse tra loro che si integrano col tessuto urbano, generando nello stesso ambiente sistemi diversi, grazie alla presenza della collina, dei fiumi, dei parchi e delle aree agricole.

L'espansione del tessuto urbano torinese ha avuto inizio dal secondo dopoguerra grazie al boom industriale e al conseguente incremento

demografico dovuto dai flussi migratori provenienti dal Sud Italia. La forte domanda abitativa dell'epoca ha fatto sì che l'urbanizzato non seguisse regole compositive e distributive chiare, dando origine a fenomeni di sprawl diffusi. Le conseguenze di una mancata pianificazione si sentono ancora oggi, a causa dell'assenza di un sistema infrastrutturale ben organizzato, che provoca spesso la marginalità dei comuni limitrofi, generando un'estesa periferia dove i tassi di disoccupazione si concentrano, aggravando i fattori di degrado e insicurezza.

In questo scenario si colloca il Progetto ToP Metro, che interessa i comuni che costituiscono la periferia di prima cintura del Capoluogo. L'area di intervento è rappresentata dagli 11 comuni contermini alla Città di Torino, con popolazione superiore a 10.000 abitanti: Beinasco, Borgaro

Torinese, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, Settimo Torinese, San Mauro Torinese e Venaria Reale.

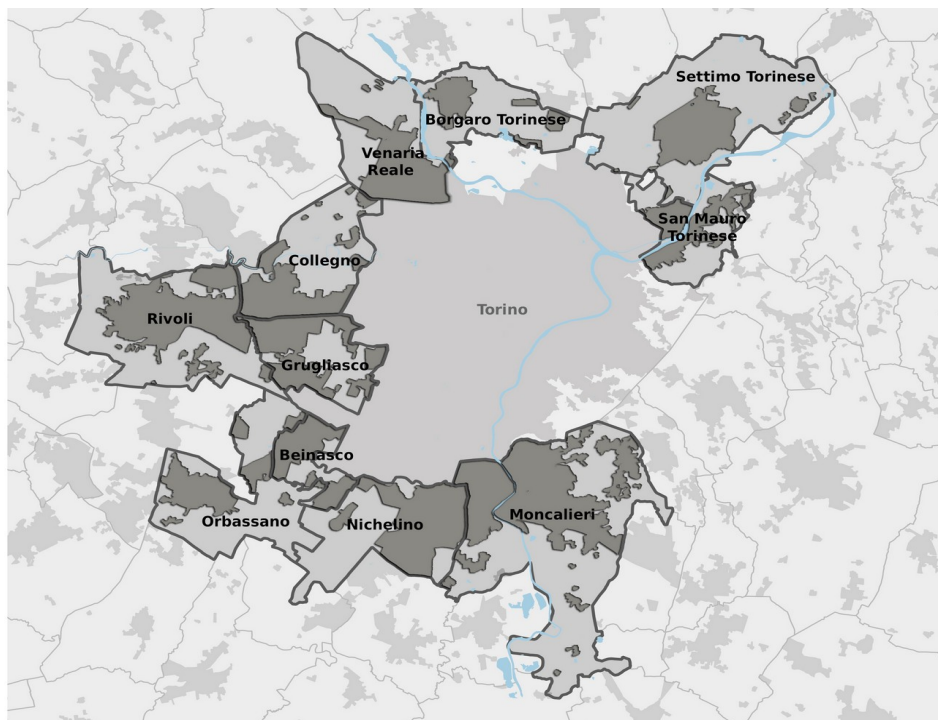

La scelta di circoscrivere l'area d'intervento a soli 11 Comuni contermini a Torino - su un totale di 312 Comuni<sup>1</sup> inclusi nella CMT - ha consentito un effettivo processo di co-progettazione e una più ampia coerenza della proposta progettuale: l'individuazione dei Comuni contermini, che presentano caratteristiche urbane, infrastrutturali e dinamiche socio-economiche simili a quelle della Città stessa, ha infatti favorito l'integrazione tra i diversi interventi previsti, massimizzandone così l'efficacia.

<sup>1</sup> A seguito della fusione di alcuni Comuni, il numero complessivo delle amministrazioni comunali ricomprese nel territorio della CMT è passato da 316 a 312.

## Il numero e la tipologia degli interventi

Il progetto comprende 120 interventi, ricadenti in una delle 5 tipologie di azione previste dall'art. 4 comma 3 del Bando di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016, e nello specifico:

- 111 interventi puntuali di livello comunale;
- 5 interventi trasversali, attuati dalla Città metropolitana di Torino e riguardanti la tipologia di azione D
- 4 interventi di area vasta, attuati dalla Regione Piemonte e riguardanti la tipologia di azione E.

Enti attuato-ri	Numero interventi per tipologia d'azione					Tot
	Miglioramento della qualità del decoro urbano (art.4 c.3 lett.a)	Manutenzione, riuso e rifunionalizzaz. di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse pubblico (art.4 c.3 lett.b)	Accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana (art.4 c.3 lett.c)	Potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana (art.4 c.3 lett.d)	Mobilità sostenibile e adeguamento infrastrutture per servizi sociali, culturali, educativi e didattici (art.4 co.3 lett.e)	
Beinasco	4	2	0	0	0	<b>6</b>
Borgaro	0	3	0	0	0	<b>3</b>
Collegno	4	13	1	7	0	<b>25</b>
Grugliasco	1	4	4	0	0	<b>9</b>
Moncalieri	0	7	2	0	5	<b>14</b>
Nichelino	0	0	1	0	3	<b>4</b>
Orbassano	0	4	0	0	0	<b>4</b>
Rivoli	1	10	1	0	0	<b>12</b>
San Mauro	3	1	2	0	0	<b>6</b>
Settimo	1	6	1	0	0	<b>8</b>
Venaria	4	6	1	2	7	<b>20</b>
Regione	0	0	0	0	4	<b>4</b>
CMT	0	0	0	5	0	<b>5</b>
<b>Totale</b>	<b>18</b>	<b>56</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>120</b>

Il numero di interventi differisce da quello indicato nel dossier di candidatura perché tiene conto dei diversi lotti funzionali (considerati come un intervento a sé) e dei nuovi interventi di cui alla rimodulazione approvata con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0000764 del 15 maggio 2018.

Attualmente, per quanto riguarda le fonti di finanziamento, il numero degli interventi autorizzati, finanziati in tutto o in parte a valere sul Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie è di 73, mentre il numero degli interventi finanziati dai privati o con altre risorse a disposizione degli enti attuatori è pari a 47.

Successivamente alla prima richiesta di rimodulazione approvata con vs nota del del 15 maggio 2018 sopra citata, si sono rese necessarie ulteriori **richieste di rimodulazione** ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Convenzione, e precisamente:

- **Città di Borgaro**, intervento **"B1-BOR** - Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo, nel tratto compreso fra le vie Martiri della Libertà e Italia": il Comune di Borgaro ha espresso la necessità di implementare la funzione dedicata alla frequentazione pedonale eliminando la prevista rotonda viaria a favore dell'allargamento della "piastra" pedonale, considerando che, ultimati i lavori nell'attigua Via Svizzera, è stato osservato un diverso utilizzo degli spazi urbani che ha privilegiato l'utilizzo pedonale rispetto a quello viario. Al fine di attuare tali modifiche è stata richiesta una nuova tempistica di esecuzione dei lavori;
- **Città di Nichelino**, intervento **"E2-NIC** - Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni": richiesta in quanto il Comune di Nichelino, sulla base di esperienze e confronti con altre realtà cittadine, istituzionali ed associative e dall'esperienza di progetti innovativi testati con esiti positivi ("progetto Dislessia" e "Bibli notte"), ha espresso la necessità di ripensare la fruizione degli spazi prevista, a favore di nuovo concetto di biblioteca pubblica, che da luogo fisico si trasformi in "spazio di partecipazione", dando forza al concetto di servizio attento ai bisogni dei cittadini. Al fine di attuare tali modifiche è stata richiesta una nuova tempistica di esecuzione dei lavori;
- **Città Metropolitana di Torino - D1 Mip al ToP**: Mip al Top è uno strumento volto a stimolare il radicamento di nuove attività produttive favorendo l'auto-impiego consapevole come efficace strumento di creazione di occupazione e genera inoltre un effetto incentivante per lo sviluppo economico, anche nelle aree più problematiche e periferiche. Nella rimodulazione si chiede la possibilità di ampliare la finestra temporale di durata del progetto, considerando che la Regione Piemonte ha avviato l'iter di approvazione delle linee di indirizzo per le attività di sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo per il periodo 2020 – 2022, che estende al 31/12/2022 il periodo di durata del Protocollo di intesa sottoscritto fra Regione Piemonte e Città metropolitana di Torino. La rimodulazione è volta altresì a rivedere le modalità di erogazione della quota di contributo destinata alle spese di promozione, allineando il bando con gli obblighi documentali di

rendicontazione previsti dall'Ente, con conseguente modifica dell'originaria previsione di un contributo forfettario anticipato per le spese in parola;

- **Città Metropolitana di Torino - D2-CMTO Top Edge** : alla luce dei risultati già ottenuti sia in termini di investimenti che di occupazione ed anche in funzione della situazione di crisi economica che ha colpito l'area metropolitana torinese nella quale sono compresi tutti i comuni del Bando periferie tanto da essere riconosciuta quale "Area di crisi industriale complessa" dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 16 aprile 2019, si rende necessaria una terza apertura del bando. Pertanto si richiede di riaprire il bando, innalzando sia la percentuale di contributo che quella relativa alla quota per assunto, al fine di attrarre maggiori investimenti e consentire l'accesso all'agevolazione anche alle micro e piccole imprese che intendano effettuare investimenti contenuti, ma con positivi effetti occupazionali;
- il **Comune di Rivoli**, come già indicato nella precedente Relazione di monitoraggio, al fine di finanziare le maggiori spese sopravvenute per l'intervento "B3-RIV messa in sicurezza ed adeguamento normativo scuola media Gobetti" ha richiesto di utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita all'intervento "B8.1- RIV", il quale sarà sostenuto con un pari aumento del contributo a carico del Comune e dal previsto contributo con fondi privati;
- **Città di Settimo Torinese**: l'Amministrazione comunale ha chiesto di rimodulare l'intervento **B.1.2** relativo alla nuova sede del comando della Polizia Locale in Stazione a favore del nuovo intervento "B8 - riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo nuovo" (importo totale in rimodulazione 1.000.000 €). La motivazione della richiesta risiede, in parte nell'impossibilità di avere tempi certi di attuazione della nuova sede del comando di Polizia municipale e in parte dalla necessità, valutata dalla nuova Amministrazione comunale, di sostenere prioritariamente la riqualificazione del Borgo nuovo, quartiere popoloso e in declino;
- **Comune di San Mauro Torinese**: il comune ha espresso la necessità di potenziare e di investire maggiormente sull'intervento "B1-SAN – Area verde Pragranda" (ritenendo che lo stesso possieda alta valenza sociale, economica ed ambientale) ed al fine di finanziare le maggiori opere, il Comune ha richiesto di poter utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita ai tre interventi: "A1-SAN–Sistemazione area verde del Porto", "A2-SAN–Riquilificazione Via Mirande", "C2-SAN – Realizzazione orti urbani nel distretto di Sambuy", che saranno realizzati in tempi diversi con risorse comunali;

Con nota prot. 0000383 del 20/05/2020 il Gruppo di monitoraggio della presidenza ha **approvato le rimodulazioni** relative a: **Città metropolitana di Torino, Rivoli, Nichelino e Borgaro** mentre per quanto riguarda le richieste formulate dai Comuni di Settimo Torinese e S. Mauro Torinese, il Gruppo di monitoraggio ha deliberato di richiedere integrazioni documentali in ordine ai tempi di realizzazione degli interventi oggetto di definanziamento. Si sta quindi procedendo alla trasmissione dell'integrazione richiesta.

Tutte le richieste sopracitate non modificano il contributo statale previsto.

### L'importo complessivo del Progetto e le eventuali variazioni rispetto all'importo iniziale

Il prospetto sottostante recepisce le modificazioni economiche intercorse con l'approvazione delle rimodulazioni di cui sopra. La tabella successiva riporta l'investimento totale del Progetto ToP Metro (euro **108.735.483,18**), il contributo richiesto a valere sul Programma per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (euro **39.658.004,79**) nonché il cofinanziamento pubblico e privato previsto (pari rispettivamente a euro 30.796.574,02 e a euro 38.280.904,37) .

Enti attuatori	Investimento totale	Contributo richiesto	Cofinanziamento privato	Cofinanziamento pubblico
Beinasco	4.137.255,66	2.087.328,66	2.025.897,00	24.000,00
Borgaro Torinese	12.822.111,00	2.000.000,00	9.000.000,00	1.822.111,00
Collegno	21.228.022,74	5.378.650,00	5.402.547,15	10.446.825,59
Grugliasco	6.998.500,00	2.970.000,00	3.573.000,00	455.500,00
Moncalieri	10.674.000,00	4.434.000,00	2.072.000,00	4.168.000,00
Nichelino	2.293.000,00	2.053.000,00	50.000,00	190.000,00
Orbassano	4.163.148,00	3.339.085,00	824.063,00	0,00
Rivoli	8.790.431,01	3.935.596,21	2.553.134,72	2.301.700,08
San Mauro Torinese	1.986.460,00	1.986.460,00	0,00	0,00
Settimo Torinese	15.087.377,00	3.680.977,00	5.000.000,00	6.406.400,00
Venaria Reale	12.138.836,34	3.010.836,20	3.696.500,00	5.431.500,14
Regione Piemonte	1.259.884,22	1.259.884,22	0,00	0,00
Città Metropolitana	11.594.450,00	3.522.187,50	8.072.262,50	0,00
<b>Totale</b>	<b>113.173.445,97</b>	<b>39.658.004,79</b>	<b>42.269.404,37</b>	<b>31.246.036,81</b>

La Convenzione stipulata tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città metropolitana di Torino ha previsto un investimento totale di € 93.006.344,27 e un contributo statale pari € 39.942.803,58.

Successivamente, tali importi sono stati aggiornati, in quanto molti interventi hanno beneficiato di un ulteriore contributo a livello comunale e vi è stata una leggera riduzione (- € 284.798,79) del contributo richiesto.

Il presente monitoraggio, rispetto al precedente:

- conferma il valore del contributo;

- conferma il trend di **incremento dell'investimento totale** pari a + 62.713.862,11.

La variazione dell'importo relativo all'investimento totale + 4.437.932,79 che si registra nel presente monitoraggio è principalmente dovuta all'incremento di + 3.988.500,00 € di fondi regionali per il progetto "Mip al Top" della Città metropolitana di Torino.

Si registra, altresì, un aumento della quota a carico della città di Rivoli di € 449.462,79 (227.674,3 € come da rimodulazione e modifiche interventi B3-RIV, B6-RIB, B8-RIV approvata e una ulteriore quota pari a € 221.788,49 per finanziare una variante per l'intervento B3).

Tale incremento a livello generale dell'investimento, è indice dell'alto interesse che sta riscuotendo il "Progetto ToP Metro" sul territorio metropolitano e del volano economico che sta rappresentando per la comunità.

### **Il cronoprogramma di realizzazione del Progetto complessivo e per singoli interventi**

A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 108/2018 (legge di conversione del cosiddetto decreto "Milleproroghe"), che ha differito al 2020 l'efficacia delle Convenzioni sottoscritte tra la Presidenza del Consiglio, molti enti attuatori hanno sospeso l'esecuzione degli interventi, in attesa di avere certezze rispetto al finanziamento statale.

L'art. 1, commi da 913 a 916, della Legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) ed in particolare il comma 914 ha previsto che le Convenzioni sottoscritte nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie producano nuovamente effetti a partire dal 2019, e il comma 916, ha previsto l'adeguamento delle Convenzioni già sottoscritte.

Pertanto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto di modificare la Convenzione a suo tempo sottoscritta con la Città Metropolitana di Torino ed ha inviato il nuovo testo in data 25/02/2019 a mezzo pec. Tale nuova Convenzione di modifica è stata sottoscritta dalla Sindaca Metropolitana in data 06/03/2019 (Decreto della Sindaca metropolitana n. 69-2280/2019 del 06/03/2019). Il 21/03/2019 la medesima Convenzione è stata sottoscritta anche dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio in data 08/04/2019 ed è stata approvata con Decreto del Segretario generale e il 28/05/2019. La Corte dei Conti ha comunicato di avere registrato la Convenzione di modifica (n. registrazione 1-1065/2019).

Visto quindi il clima di incertezza generato dalla sospensione dell'efficacia delle convenzioni e, successivamente, dalla ripresa del Programma, alcuni Enti attuatori hanno ritenuto di procedere a **richieste di proroghe, fermo restando che le nuove tempistiche di ultimazione previste devono necessariamente tenere conto anche del periodo di sospensione** della convenzione disposta dalla legge n 108/2018 "Milleproroghe", come anche indicato dalla nostra nota del 14/03/2019 ns. prot. 23959, ovvero *"in considerazione del fatto che la Convenzione risultava sospesa ex lege dalla data di entrata in vigore della Legge n. 108/2018 "Milleproroghe" (22/09/2018) sino alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 n.*



*145/2018 (01/01/2019) e perfeziona i suoi effetti una volta registrata la Convenzione di Modifica alla Corte dei Conti si ritiene che detta sospensione sia da applicare a tutti gli interventi del Progetto "Top Metro" in aggiunta rispetto ad eventuali proroghe adeguatamente motivate".*

**Il Gruppo di monitoraggio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato le proroghe trasmesse da aprile 2019 a febbraio 2020 con le note prot. n. 0001255 dell' 08/11/2019 e prot. n. 0000383 del 20/05/2020**

In data **20 febbraio 2020**, è stata inoltrata una successiva richiesta di proroga, relativa agli interventi: A2/A3-BEI, B2 BEI, B5 COL, A1 GRU, B1 GRU, C1 NIC, E1-NIC, A3 SAN per la quale si è **in attesa del riscontro** da parte del Gruppo di monitoraggio.

Il presente monitoraggio si svolge in concomitanza con l'**emergenza epidemiologica Covid-19**, tutt'ora in corso, che ha inevitabilmente condizionato alcuni interventi facenti parte del progetto, i quali, essendo poi estremamente trasversali nelle loro caratteristiche, hanno registrato varie casistiche di difficoltà.

Dal punto di vista degli interventi che prevedono dei **lavori edili**, le chiusure forzate disposte dai Decreti nazionali hanno di fatto fermato quasi tutti gli interventi in corso. Dove era in corso l'aggiudicazione dei lavori, si rilevano criticità dovute all'impossibilità di spostamenti per sottoscrivere i contratti e le consegne dei lavori.

Una volta consentite le riaperture delle attività edili e superata la difficoltà di approvvigionamento delle materie prime, sono seguite le operazioni tecnico-amministrative per adeguare le lavorazioni ai protocolli anti-contagio, che hanno determinato degli imprevedibili ritardi nelle tempistiche e hanno stabilito, a loro volta, nuove tempistiche di esecuzione degli interventi, in quanto le attività hanno dovuto essere completamente ripensate e ripianificate, soprattutto per gli interventi che vedono la compresenza di maestranze in luoghi chiusi.

Parimenti, per quanto attiene gli interventi che prevedono **attività frontali**, come la **formazione** o gli scambi culturali, è stato necessario riprogrammare e trovare delle alternative di somministrazione delle stesse.

Sono stati segnalati, inoltre, altri ritardi nel perfezionare atti e documenti amministrativi.

La Città Metropolitana di Torino, vista la criticità a livello generale che si stava delineando a causa dell'epidemia di Covid-19, già all' inizio del mese di marzo 2020 aveva richiesto una proroga di 6 mesi per l'intero progetto "ToP Metro".

**In sede di effettuazione del presente monitoraggio, sono state pertanto raccolte le segnalazioni di sofferenza tempistica ed economica (extra costi di adeguamento dei protocolli sanitari), alla quale seguirà immediata comunicazione al Gruppo di monitoraggio della Presidenza per la definizione e quantificazione dei ritardi dovuti a tale emergenza sanitaria.**

### **Impegni contrattualizzati, costi realizzati e pagamenti effettuati**

Relativamente al semestre considerato, gli importi complessivi del Progetto ToP Metro sono i seguenti:

- impegni contrattualizzati : euro 7.488.384,65
- spese sostenute nel semestre: euro 3.329.445,85
- pagamenti effettuati: euro 3.221.400,29
- totale spese sostenute: euro 9.866.157,13

Gli impegni contrattualizzati totali fino al 30/06/2020 sono stati pari ad € 46.712.555,44

### **Rendicontazione delle spese**

Dall'inizio del programma ad oggi, sono state effettuate **tre** rendicontazioni delle spese sostenute e certificate, come previsto dalla Convenzione art. 7 e precisamente:

- primo semestre 2019 importo di € 2.463.131,71 **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot. 0000382 del 20/05/2020;
- secondo semestre 2019 importo di € 3.235.206,36 **approvata** con nota della Presidenza del Consiglio prot.. 0000490 del 18/06/2020;
- primo semestre 2020 importo di € 3.320.527, 83 , inviata a giugno 2020, in attesa di approvazione;

per un totale di € 9.018.865,90, pari a circa il 23% del contributo statale.

In concomitanza con la terza rendicontazione è stata trasmessa, con separata nota, la **richiesta della quota finale pari al 5% finale** relativa agli

interventi:

- B1-MON Riquilificazione di arterie viarie - C.so Trieste
- B4-MON Riquilificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato
- B6-MON Riquilificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo
- E2-MON Adeguamento Scuola Luigi Pirandello

che sono stati ultimati.

Si rimane in attesa dell'erogazione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle rendicontazioni approvate e della quota finale degli interventi sopra citati.

### Lo stato degli interventi e il livello di attuazione

La tabella seguente riporta lo stato degli interventi finanziati (interventi attivi, sospesi e critici) e il livello di attuazione degli stessi (approvazione capitolato d'oneri, approvazione progetto definitivo, approvazione progetto esecutivo, in fase di gara/bando, in esecuzione, stato finale dei lavori, collaudo).

Come si può notare, gli interventi, nonostante le criticità già note in merito alla sospensione dell'efficacia delle Convenzioni ed all'emergenza sanitaria, hanno proseguito il loro iter.

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
Beinasco	1	A1-BEI	Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest	Attivo	Collaudo
	2	A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento	Attivo	Collaudo
	3	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	Attivo	Stato finale dei lavori
	4	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	Attivo	In fase di gara/bando
	5	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto	Attivo	In esecuzione

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
Borgaro T.se	6	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo	Attivo	In esecuzione- intesa come totalità del progetto, in quanto il lotto funzionale II relativo alla sola Via Svizzera è collaudato e per il lotto di Via Lanzo è stata approvata la rimodulazione e si è avviata la procedura propedeutiche alla gara
Collegno	7a	A1-COL	Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio.	Attivo	Collaudo
	7b	A2- COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	Attivo	Collaudo
	8a	B1a-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	Attivo	Stato finale dei lavori –
	8b	B1b-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	Attivo	Collaudo
	8c	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	Attivo	Collaudo
	8d	B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	Attivo	Collaudo
	8e	B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	Attivo	Stato finale dei lavori
	9	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	Attivo	Collaudo
	10	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	Attivo	In esecuzione
	11	C1/C2/C3-COL	Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	Attivo	Collaudo
	12a	A3/D1a/D3/D4-COL	Riqualificazione urbana e coesione sociale	Attivo	In esecuzione
12b	D1b-C OL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	Attivo	In esecuzione	
Grugliasco	13	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	Attivo	In fase di gara/bando-
	14	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	Attivo	In fase di gara/bando -

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
	15	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	Attivo	In fase di gara/bando
	16a	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	Attivo	Stato finale dei lavori
	16b	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	Attivo	Collaudo
	16c	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	Attivo	Collaudo
	16d	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	Attivo	Collaudo
Moncalieri	17	B1-MON	Riquilificazione di arterie viarie - C.so Trieste	Attivo	Collaudo- <b>Intervento ultimato – richiesta erogazione quota finale</b>
	18	B2-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Via Pastrengo	Attivo	Collaudo
	19	B3-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi	Attivo	Stato finale dei lavori
	20	B4-MON	Riquilificazione di arterie viarie - P.zza del Mercato	Attivo	Collaudo - <b>Intervento ultimato – richiesta erogazione quota finale</b>
	21	B5-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. Palera	Attivo	Stato finale dei lavori
	22	B6-MON	Riquilificazione di arterie viarie - Str. del Bossolo	Attivo	Collaudo - <b>Intervento ultimato – richiesta erogazione quota finale</b>
	23	B7-MON	Ulteriori lavori di riqualificazione di arterie viarie	Attivo	In esecuzione
	24	C2-MON	Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova Caserma Polizia Locale	Attivo	In esecuzione
	25	E2-MON	Adeguamento Scuola Luigi Pirandello	Attivo	Collaudo - <b>Intervento ultimato – richiesta erogazione quota finale</b>
	26	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	Attivo	Collaudo

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
	27	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	Attivo	In esecuzione
	28	E5-MON	Installazione nuove postazioni Bike Sharing	Attivo	Approvazione progetto esecutivo
Nichelino	29	C1-NIC	Manutenzione straordinaria caserma carabinieri	Attivo	In esecuzione
	30	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto	Attivo	In esecuzione
	31	E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni	Attivo	In esecuzione
Orbassano	32	B1-ORB	Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza Umberto I	Attivo	In fase di gara/bando-
	33	B2-ORB	Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	Attivo	Approvazione progetto esecutivo -
Rivoli	34	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riqualificazione del sito	Attivo	Collaudo
	35	B1-RIV	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	Attivo	Collaudo
	36	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	Attivo	In esecuzione -
	37	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole materne e elementare Casa del Sole e Rodari	Attivo	Collaudo-
	38	B8.1-RIV	Riqualificazione zona di Via Ivrea	<i>rimodulato a favore intervento B3_RIV (approvazione PCM prot. 383 del 20/05/20)</i>	
	39	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo del territorio	Attivo	In fase di gara/bando -
San Mauro T.se	40	A1-SAN	Sistemazione Area verde di Via del Porto	<i>in attesa di approvazione rimodulazione a favore intervento B1 SAN</i>	
	41	A2-SAN	Riqualificazione di Via Mirande	<i>in attesa di approvazione rimodulazione a favore intervento B1 SAN</i>	
	42	A3-SAN	Lavori di riqualificazione di Via Casale	Attivo	Collaudo
	43	B1-SAN	Area verde Pragranda	Attivo	In esecuzione - in attesa di approvazione rimodulazione -



Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
	44	C1-SAN	San Mauro Sicura	Attivo	In esecuzione
	45	C2-SAN	realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy	<i>in attesa di approvazione rimodulazione a favore intervento B1 SAN</i>	
Settimo T.se	46	A1-SETT	Riquilibrata di via Roma in Settimo Torinese	Attivo	Collaudo
	47	B1-SETT_2	Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	Attivo	Approvazione progetto esecutivo
	48	B3-SETT	Riquilibrata impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci"	Attivo	In esecuzione
	49	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	Attivo	In fase di gara/bando
	49b	B8_SETT	riqualificazione funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo	<i>In attesa di approvazione della rimodulazione</i>	
Venaria Reale	50	A2-VEN	Riquilibrata sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	Attivo	In esecuzione
	51	B2.1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (MAN. FASE 4)	Attivo	In esecuzione
	52	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	Attivo	In fase di gara/bando-
	53	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	Attivo	Stato finale dei lavori
	54	D1-VEN	Progetto Housing Sociale "Cà Buozi"	Attivo	In esecuzione
	55	E2-VEN A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	Attivo	In esecuzione
	56	E3-VEN A3	Riquilibrata impianti Illuminazione Pubblica	Attivo	In esecuzione
Regione Piemonte	57a	E1-CORV_1	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Governance	Attivo	In esecuzione
	57b	E1-CORV_2	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	Attivo	In esecuzione
	57c	E1-CORV_3	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	Attivo	In esecuzione
	57d	E1-CORV_4	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualificazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	Attivo	In esecuzione
Città	58	D1-CMTO	Mip al Top	Attivo	In esecuzione

Ente attuatore	ID	Cod. Intervento	Titolo Intervento	Stato	Livello di attuazione
metropolitana di Torino	59	D2-CMTO	Top Edge	Attivo	In esecuzione
	60a	D3-CMTO_1	Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	Attivo	In esecuzione
	60b	D3-CMTO_2	Fa Bene: materiali promozionali	Attivo	n esecuzione

I grafici sottostanti rappresentano gli stati di attuazione del precedente monitoraggio confrontato con i precedenti (gennaio/giugno 2019 e luglio/dicembre 2019).


Come si può notare, è nettamente visibile l'avanzamento di stato di molti interventi, lo "svuotamento" progressivo dei due stadi iniziali di progettazione a favore dell'esecuzione e, da questa, il passaggio alla conclusione dei lavori e collaudo.

Il Progetto ToP Metro della Città metropolitana procede avanza visibilmente nella sua attuazione.

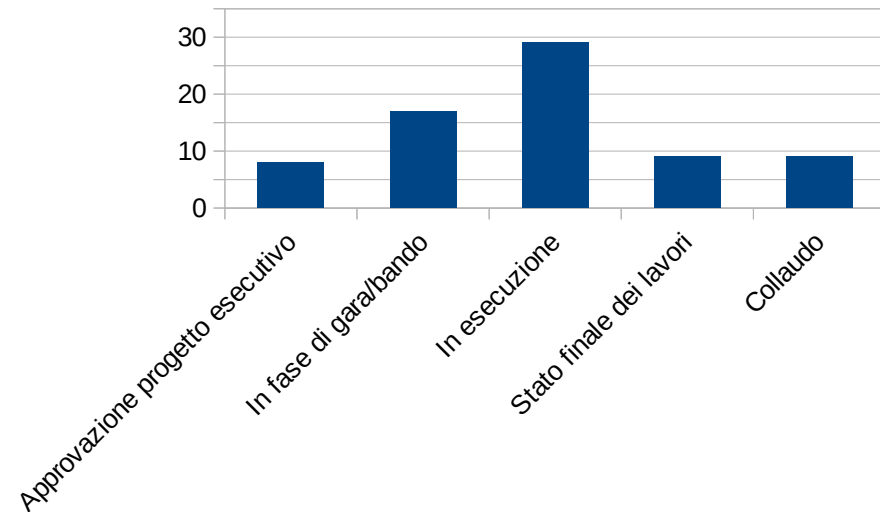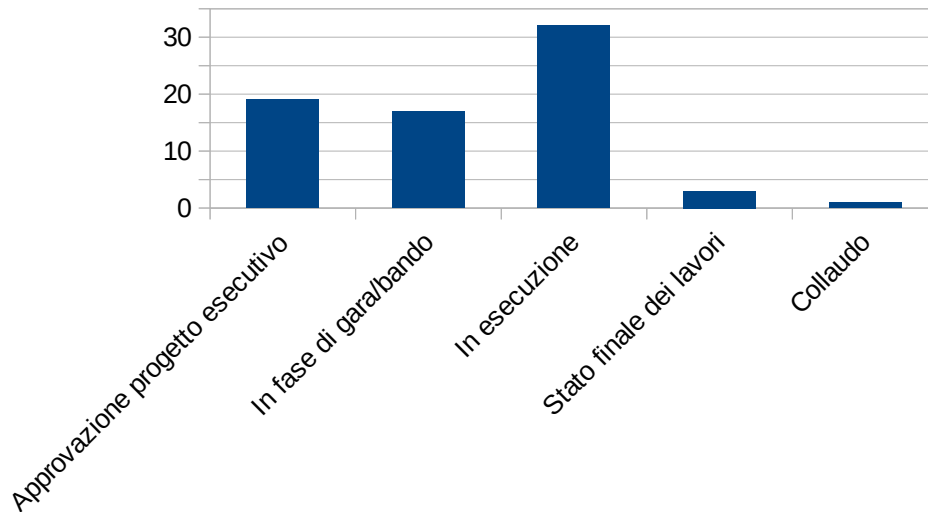



Attuazione al 30 giugno 2019

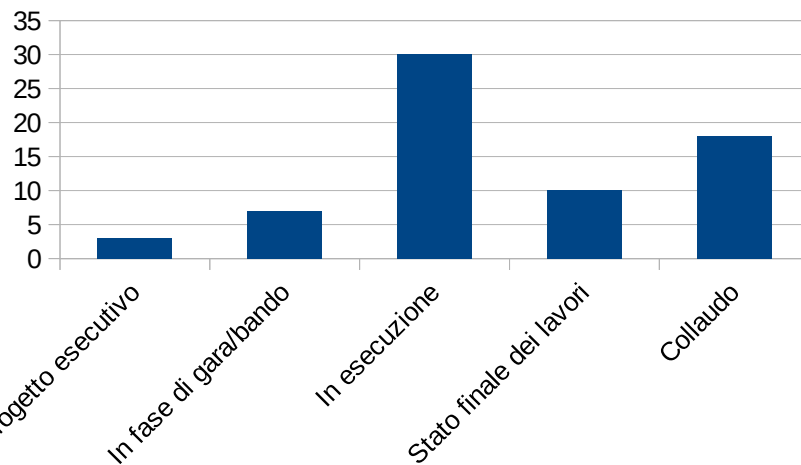

Attuazione al 31 dicembre 2019

Attuazione al 30 giugno 2020

## 2. OSSERVAZIONI SINTETICHE SULL'ANDAMENTO DEI SINGOLI INTERVENTI

La successiva tabella indica i dati finanziari e le eventuali variazioni rispetto alle somme inizialmente previste. I dati recepiscono le rimodulazioni approvate.

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
1	A1-BE1	Opere di urbanizzazione via Moro Via Togliatti – Recupero Parcheggio Ovest	160.000,00		160.000,00	Nessuna modifica.

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
2	A2/A3-BEI	Rifacimento del tappetino stradale e posa arredo urbano su strada Torino strada Orbassano e viale Risorgimento	1.391.031,66		1.391.031,66	è stato riportato il corretto importo del finanziamento statale così come indicato nella rimodulazione licenziata dalla Presidenza approvata con comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri prot. n. 0000764 del 15 maggio 2018, che ha riconosciuto all'intervento un importo pari a € 1.391.031,66.
3	A4-BEI	Ampliamento della viabilità frazione Borgaretto- Area Cimitero	112.000,00		112.000,00	Nessuna modifica
4	B1-BEI	Progetto di restauro ex chiesa Santa croce	260.000,00	24.000,00	284.000,00	A seguito della definizione della progettazione, è stato aggiunto come cofinanziamento comunale.
5	B2-BEI	Adeguamento spogliatoi Impianto Sportivo Totta a Borgaretto	164.297,00		164.297,00	Nessuna modifica
6	B1-BOR	Lavori di riqualificazione urbana tramite la ristrutturazione urbanistica del comparto sotteso dalla via Lanzo Lotto I	2.000.000,00	1.822.111,00	3.822.111,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 2.793.057 si è ridotto a euro 1.822.111
7a	A1-COL	Aree verdi residuali: Pulire i BORDI per riqualificare il territorio.	100.000,00		100.000,00	Nessuna modifica
7b	A2-COL	Aree verdi occupate e/o abbandonate: Rigenerare gli SPAZI VERDI nei quartieri per sviluppare legami	350.000,00		350.000,00	Nessuna modifica
8a	B1a-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 1	300.000,00		300.000,00	Nessuna modifica
8b	B1b-COL	RICUCITURE E SICUREZZA STRADALE organizzare e rendere sicuro per CONNETTERE luoghi e persone - lotto 2	300.000,00		300.000,00	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
8c	B2-COL	PLAYGROUND riqualificare SPAZI pubblici per Wellness diffuso	300.000,00		300.000,00	Nessuna modifica
8d	B3a-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (arredo urbano)	120.000,00		120.000,00	Nessuna modifica
8e	B3b-COL	PIAZZE da qualificare: attrezzare per sviluppare identificazione sociale e appartenenza (coperture permanenti)	280.000,00		280.000,00	Nessuna modifica
9	B4-COL	SPAZI VANDALIZZATI street ART per riqualificare	100.000,00		100.000,00	Nessuna modifica
10	B5-COL	RECUPERO SPAZI PUBBLICI ABBANDONATI per superare la dispersione scolastica	2.570.000,00	2.000.000,00	4.570.000,00	Nessuna modifica
11	C1/2/3-COL	Videosorveglianza, innovazione tecnologica, servizi logistici e di supporto	368.650,00	61.350,00	430.000,00	Nessuna modifica
12a	A3/D1a/ D3/D4-COL	Riqualificazione urbana e coesione sociale	500.000,00		500.000,00	Nessuna modifica
12b	D1b-COL	Avvicinare le istituzioni ai cittadini. Presenza DIFFUSA per sviluppare appartenenza e legami di prossimità	90.000,00		90.000,00	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
13	A1-GRU	riqualificazione area verde compresa fra le vie Galimberti - Montanaro	700.000,00	50.000,00	750.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 50.000
14	B1-GRU	riqualificazione Viabilità quartiere ATC	300.000,00		300.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000,00 è stato eliminato.
15	B2-GRU	riqualificazione viabilità borgata Gerbido	1.670.000,00	395.500,00	2.065.500,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 395.500,00.
16a	C1-GRU	integrazione del sistema di videosorveglianza con postazione attive di ripresa/registrazione	150.000,00	5.000,00	155.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale è stato definito in euro 5.000
16b	C2-GRU	modifica parziale sistema di telecomunicazione radio dei servizi cittadini di sicurezza armata e difesa civile	60.000,00	5.000,00	65.000,00	Si ipotizza un maggior incremento della quota comunale.
16c	C3-GRU	sostituzione del sistema informatico della centrale operativa della sicurezza cittadina	60.000,00		60.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 5.000 è stato eliminato
16d	C4-GRU	integrazione presso la centrale operativa della difesa civile, presso il municipio, di un sistema di allertamento per calamità ed emergenze	30.000,00		30.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 4.500 è stato eliminato
17	B1-MON	Riqualificazione di arterie viarie - C.so Trieste	480.000,00		480.000,00	Nessuna modifica
18	B2-MON	Riqualificazione di arterie viarie - Via Pastrengo	615.000,00		615.000,00	Nessuna modifica
19	B3-MON	Riqualificazione di arterie viarie - Str. Stupinigi	346.000,00		346.000,00	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
20	B4-MON	Riqualficazione di arterie viarie - P.zza del Mercato	132.000,00		132.000,00	Nessuna modifica
21	B5-MON	Riqualficazione di arterie viarie - Str. Palera	266.000,00		266.000,00	Nessuna modifica
22	B6-MON	Riqualficazione di arterie viarie - Str. del Bossolo	95.000,00		95.000,00	Nessuna modifica
23	B7-MON	Ulteriori lavori di riqualficazione di arterie viarie	500.000,00		500.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
24	C2-MON	Interventi per la sicurezza del territorio e della comunità - Nuova Caserma Polizia Locale	1.500.000,00		1.500.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
25	E2-MON	Adeguamento Scuola Luigi Pirandello	50.000,00		50.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018
26	E3-MON	Rifacimento pavimentazione palestra scuola Montessori	99.000,00		99.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
27	E4-MON	Parco scolastico e culturale "Cascina Maina" e percorsi ciclabili	300.000,00		300.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
28	E5-MON	Installazione nuove postazioni Bike Sharing	51.000,00		51.000,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
29	C1-NIC	Manutenzione straordinaria caserma carabinieri	450.000,00	150.000,00	600.000,00	A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 150.000
30	E1 - NIC	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica 2° lotto	1.540.000,00	40.000,00	1.580.000,00	A seguito della definizione della progettazione, è stato inserito un cofinanziamento comunale, inizialmente non previsto, di euro 40.000
31	E2 - NIC	Per tutti e per ciascuno la biblioteca Arpino di Nichelino quale luogo di nuovi legami e connessioni	63.000,00		63.000,00	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
32	B1-ORB	Rifunzionalizzazione, consolidamento strutturale e restauro conservativo del Palazzo Comunale e del campanile in Piazza Umberto I	1.795.512,00		1.795.512,00	Nessuna modifica
33	B2-ORB	Restauro conservativo e rifunzionalizzazione degli immobili costituenti il complesso denominato "ex Cottolengo"	1.543.573,00		1.543.573,00	A seguito della definizione della progettazione, il contributo è stato precisato in euro 1.543.573,00
34	A1-RIV	Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riqualificazione del sito	160.000,00	2.983,87	162.983,87	si riporta l'aggiornamento dell'importo totale dell'intervento "A1-RIV - Abbattimento edificio ex magazzino di via Orsiera e riqualificazione del sito", in conseguenza alle maggiori spese tecniche pari a € 2.983,87 sostenute con risorse comunali e senza modifiche al contributo richiesto
35	B1-RIV	Riqualificazione impianti di illuminazione pubblica	217.593,20	64.581,47	282.174,67	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
36	B3-RIV	Messa in sicurezza e adeguamento normativo scuola media Gobetti (certificato prevenzione incendi, serramenti e miglioramento sismico)	645.999,08	427.109,03	1.073.108,11	<p><b>Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020 con contestuale richiesta di proroga dei lavori con termine al 09/04/2020.</b></p> <p>Il contributo è stato rimodulato (da € 543.257,69 a € 645.999,08). A seguito della 1° perizia di variante resasi necessaria a seguito di problematiche non prevedibili e valutabili al momento della progettazione il costo totale dell'opera e' variato da € 683.643,98 a € 851.319,62 come indicato nella rimodulazione accolta. La redazione della 2° variante, resasi nuovamente necessaria per cause impreviste ed imprevedibili ha portato il totale complessivo dell'opera a € 1.073.108,11, incrementando la quota parte a carico del Comune.</p>
37	B6-RIV	Manutenzione straordinaria scuole infanzia Freinet, Casa del Sole e Rodari	301.003,93	157.469,10	458.473,03	<p><b>Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020</b></p> <p>E' variato il costo totale, incrementando la quota parte a carico del Comune (da € 398.474,37 a € 458.473,03) a seguito di perizia di variante resasi necessaria a seguito di problematiche non prevedibili o valutabili al momento della progettazione</p>

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
38	B8.1-RIV	Riquilificazione zona di Via Ivrea	0,00			<b>Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020</b>
39	C1-RIV	Fornitura, installazione e manutenzione sistema di videocontrollo del territorio	2.611.000,00		2.611.000,00	Nessuna modifica
40	A1-SAN	Sistemazione Area verde di Via del Porto	120.000,00		120.000,00	<b>In attesa di approvazione rimodulazione</b> richiesta per potenziare ed investire maggiormente nell'intervento "B1-SAN – Area verde Pragrandà"
41	A2-SAN	Riquilificazione di Via Mirande	258.500,00		258.500,00	<b>In attesa di approvazione rimodulazione</b> richiesta per potenziare ed investire maggiormente nell'intervento "B1-SAN – Area verde Pragrandà"
42	A3-SAN	Lavori di riquilificazione di Via Casale	250.000,00		250.000,00	Nessuna modifica
43	B1-SAN	Area verde Pragrandà	858.800,00		858.800,00	<b>In attesa di approvazione rimodulazione</b> si è richiesto di poter utilizzare la quota di finanziamento statale attribuita agli interventi "A1-SAN–Sistemazione area verde del Porto", "A2-SAN–Riquilificazione Via Mirande" "C2-SAN – Realizzazione orti urbani nel distretto di Sambuy", che saranno realizzate in tempi diversi con risorse comunali.
44	C1-SAN	San Mauro Sicura	339.160,00		339.160,00	Nessuna modifica



ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
45	C2-SAN	realizzazione di orti urbani nel distretto di Sambuy	160.000,00		160.000,00	<b>In attesa di approvazione rimodulazione</b> richiesta per potenziare ed investire maggiormente nell'intervento "B1-SAN – Area verde Pragranda"
46	A1-SETT	Riquilibrata di via Roma in Settimo Torinese	142.550,00		142.550,00	Nessuna modifica
47	B1-SETT_2	Rifunzionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria per polizia locale	1.000.000,00		1.000.000,00	<b>In attesa di approvazione della rimodulazione</b> e spostamento del contributo dall'intervento B1_SETT_2 al B8_SETT
48	B3-SETT	Riquilibrata impianti sportivi scuola media statale "A. Gramsci"	288.474,00		288.474,00	rimodulazione approvata con vostra comunicazione prot. 764 del 15/05/2018 (nuovo intervento)
49	B7-SETT	Completamento delle opere a servizio del nuovo polo sportivo	2.249.953,00		2.249.953,00	Nessuna modifica
49b	B8_SETT	Riquilibrata funzionale dell'asse urbano della via Fantina nel Borgo Nuovo	1.000.000,00		1.000.000,00	<b>In attesa di approvazione della rimodulazione</b> e spostamento del contributo dall'intervento B1_SETT_2 al B8_SETT
50	A2-VEN	Riquilibrata sistema aree mercatali e viabilità di collegamento con i quartieri	410.000,00	590.000,00	1.000.000,00	Nessuna modifica
51	B2.1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali e scolastici (MAN. FASE 4)	605.000,00	245.000,00	850.000,00	A seguito della definizione della progettazione, il cofinanziamento comunale inizialmente previsto di euro 375.000 si è ridotto a euro 245.000,00
52	B3-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria edifici scolastici e comunali	645.000,00		645.000,00	Nessuna modifica
53	C1-VEN	Progetto varchi elettronici accessi città	180.836,20		180.836,20	Nessuna modifica
54	D1-VEN	Progetto Housing Sociale "Cà Buozzi"	70.000,00		70.000,00	Nessuna modifica

ID	Cod.	Titolo Intervento	Finanziam. statale	Cofinanziam. mento	Costo Totale	Eventuali variazioni finanziarie
55	E2-VEN-A2	Valorizzazione del sistema di accessibilità e delle connessioni	600.000,00	350.000,00	950.000,00	È stato aumentato il contributo comunale
56	E3-VEN - A3	Riqualficazione impianti Illuminazione Pubblica	500.000,00		500.000,00	Nessuna modifica
57a	E1-CORV_1	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualficazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Governance	241.054,32		241.054,32	Nessuna modifica
57b	E1-CORV_2	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualficazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Mobilità ciclabile	549.000,00		549.000,00	Nessuna modifica
57c	E1-CORV_3	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualficazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Piattaforma e-gov	199.829,90		199.829,90	Nessuna modifica
57d	E1-CORV_4	Corona Verde: l'infrastruttura verde per riqualficazione e ricucitura sostenibile delle periferie - Comunicazione	270.000,00		270.000,00	Nessuna modifica
58	D1-CMTO	Mip al Top	500.000,00		500.000,00	<b>Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020</b>
59	D2-CMTO	Top Edge	2.500.000,00		2.500.000,00	<b>Intervento rimodulato approvato con comunicazione PCM prot. n. 383-P del 20/05/2020</b>
60a	D3-CMTO_1	Fa Bene: azione di riduzione dello spreco alimentare	417.187,50	139.062,50	556.250,00	Nessuna modifica
60b	D3-CMTO_2	Fa Bene: materiali promozionali	105.000,00		105.000,00	Nessuna modifica

### 3. CONTESTO PROGRAMMATICO

La tabella seguente riporta il quadro finanziario, lo stato di avanzamento, nonché le eventuali variazioni progettuali e/o criticità riscontrate,

relativamente agli interventi che rientrano nel Progetto “ToP Metro”, **ma che non sono finanziati a valere sul Programma** per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie. Rispetto al precedente monitoraggio non si segnalano variazioni del quadro finanziario.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Beinasco	A2/A3-BEI	Intervento privato di riordino urbanistico e riqualificazione di aree industriali dismesse per realizzazione di nuove attività di terziario commerciale		€ 2.025.897,00	€ 2.025.897,00	L'intervento è in corso. Non ci sono state variazioni degli interventi né variazioni delle finalità degli stessi, rispetto a quanto previsto inizialmente. Non si sono verificate criticità che hanno impedito l'avvio e la realizzazione degli interventi. Non è cambiato l'importo complessivo dell'investimento previsto. Gli interventi sono stati avviati dal proponente Società BEINASCO GF s.r.l.. In data 6/9/2017 prot. 2017/18226 è stata presentata la richiesta di agibilità parziale, escludendo il locale ristorante, realizzato ma non consegnato. Le opere di urbanizzazione annesse all'intervento sono state concluse in data 18.11.2019. Le opere di urbanizzazione annesse all'intervento sono state concluse in data 18.11.2019. In data 11.3.2020 il collaudatore ha redatto il collaudo delle opere. Il collaudo è in fase di approvazione da parte della Giunta C.le.
Borgaro	B2-BOR	Riquilificazione area Ex Marchiolatti - edilizia residenziale		€ 6.000.000,00	€ 6.000.000,00	Nonostante le criticità connesse alla contrazione del mercato immobiliare, l'intervento privato è stato avviato e si prevede che si concluderà entro il 2021.
	B3-BOR	Riquilificazione area Ex Marchiolatti - centro commerciale		€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	L'intervento privato non è stato ancora avviato, ma, nonostante le criticità connesse alla contrazione del mercato immobiliare, si prevede che si concluderà entro il 2021.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Collegno	A2-COL	Intervento comunale – Aree verdi occupate e/o abbandonate	€ 400.000,00		€ 400.000,00	<p>L'intervento è stato avviato attraverso due lotti di intervento in corso di attuazione.</p> <p>Con DD. 492/2018 è stata approvata la fornitura e posa dei seguenti interventi</p> <p>A) Lavori di fornitura e posa di attrezzature ludiche da installare presso l'area giochi di nuova realizzazione in Via della Croce.</p> <p>B) Lavori di realizzazione sottofondi e pavimentazione a norma per disabili nella nuova area giochi di Via della Croce.</p> <p>C) Lavori di riqualificazione area gioco di Via Messina.</p> <p>D) Lavori di realizzazione campo multisport in Piazza della Liberazione a Savonera.</p> <p>E) Riqualificazione campo sportivo di Via La Pira/Lorenzini;</p> <p>F) Riqualificazioni straordinarie dei seguenti campi sportivi all'aperto: campo calcio Via della Croce, Parco Generale dalla Chiesa, Passeggiata Spinelli.</p> <p>G) Lavori di fornitura di attrezzature ludiche da installare presso l'area di Piazza Neruda;</p> <p>H) Lavori di manutenzione straordinaria area giochi di piazza Neruda;</p> <p>Con DD. 493/2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo e l'indizione di RDO su MEPA per la riqualificazione delle seguenti aree:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giardino Matanzas – Via Alpignano</li> <li>- Giardino Neubrandenburg – Corso Francia 234</li> </ul>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giardino Neubrandenburg – Corso Francia 234</li> <li>- Giardino Corso Antony</li> <li>- Piazza Che Guevara</li> <li>- Giardino Via della Croce</li> </ul> <p>Con DD. 974/2019 ad oggetto “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE” – AZIONE A2 COL - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI PUBBLICI – FORNITURA E POSA DI ATTREZZATURE LUDICHE E PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - RDO N° 1942762/18 - <b><u>si è approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.</u></b></p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	A2-COL	intervento privato - Aree verdi occupate e/o abbandonate		€ 80.000,00	€ 80.000,00	<p>Nell'ambito dell'insediamento di nuovo impianto di discarica della Società Barricalla, con Decreto n. 257-15645/2016 del 30 giugno 2016, la Città Metropolitana di Torino ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 12 della L.R. 40/1998 e succ.</p> <p>Nel Decreto è stato rilevato che la soluzione progettuale adottata determina l'eliminazione di una zona attualmente destinata a verde e impianto boschivo di circa 6.700 metri quadrati; Pertanto, nell'ambito dello stesso Decreto è stato subordinata la compatibilità alla realizzazione della seguente "Prescrizione":</p> <p>"Dovrà essere effettuato un intervento compensativo, in termini o di reimpianto boschivo in un'altra area o di riqualificazione della vegetazione esistente in aree parco del Comune di Collegno. Tali interventi compensativi sono stati definiti con una convenzione, schema approvato con DGC n.170 del 7/6/2017, tra l'Amministrazione Comunale e la Società Barricalla (rep. n.9362 del 9.10.2017). La Società ha quindi versato l'importo dovuto al Comune di Collegno che ha provveduto ad avviare l'iter per la selezione del soggetto a cui affidare la piantumazione dei nuovi boschi urbani.</p> <p><b>L'intervento si è concluso</b> nel 2017 con la realizzazione di :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-scarpate corso Francia 2700 mq</li> <li>-scarpata via della Croce 3000 mq</li> <li>-scarpata corso Kennedy/Neruda 1000 mq</li> </ul>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	A3-COL	intervento comunale - Riquilificazione urbana	€ 357.777,71		€ 357.777,71	<p>L'intervento è in corso Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 159/2018 il Comune di Collegno ha approvato in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Agenda Territoriale per la Casa della Provincia di Torino a firma dell'Arch. Antonio GULLI denominato "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DEGLI STECCATI DI RECINZIONE IN LEGNO E RIFACIMENTO COPERTURE EDIFICI DI CORSO FRANCIA 291 E 333.</p> <p>L'intervento sarà attuato, anche sulla scorta degli accordi in essere con l'Agenda Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in forza di Deliberazione di Consiglio n. 104 del 29.09.2016, mediante l'utilizzo dei fondi accantonati in gestione speciale ai sensi legge 513/1977 art. 25.</p> <p>Il progetto de quo - per gli interventi relativi alla sostituzione degli steccati di recinzione in legno - è munito del parere autorizzativo, ai sensi degli art. 10-12-21 del Decreto Legislativo 42/2004 e s.m.i. , rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino in data 13.02.2018. <b>Intervento in corso.</b></p>
	B1-COL	Intervento comunale - ricutture e sicurezza stradale: Opere Unity	€ 438.036,00		€ 438.036,00	L'intervento non presenta criticità e si prevede che si <b>concluderà entro il 2020.</b>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Villaggio Dora - Opere in ambito - SILE.	€ 627.101,00		€ 627.101,00	Intervento <b><u>concluso</u></b>
		Villaggio Dora - Contributo versato - SILE.	€ 287.511,00		€ 287.511,00	Intervento <b><u>concluso</u></b>



Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Fognature	€ 140.000,00		€ 140.000,00	<p>Con Determinazione Dirigenziale n. 958/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo ed indetta la gara per l'attuazione dei seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Via Antica di Rivoli – realizzazione di vasca di laminazione/sedimentazione acque di pioggia a sgravio della modesta condotta presente su strada;</li> <li>• Via Allegri / Via Venaria – constatata l'insufficienza della condotta su via Venaria e della pendenza di Via Allegri, si prevede di realizzare delle griglie di sfioro delle acque di piattaforma e di implementare lo scarico al ricettore finale attraverso l'incremento di sezione della condotta nei pressi del ponte di via Sebusto / giardino privato;</li> <li>• Via Alpignano – riprofilatura del fosso di Via San Martino ed adeguamento/ridefinizione della condotta di scarico/raccordo acque tra Via Alpignano e Via San Martino;</li> <li>• Via Torino – rifacimento della rete fognaria acque bianche tra il civico 150 ed il civico 154, in collegamento al collettore su Via Colle del Lys.</li> </ul> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 375/2018 sono stati affidati i lavori il cui inizio è previsto nel mese di settembre 2018.</p> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 932/2019 è stato <b>approvato il Certificato di regolare esecuzione.</b></p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Manutenzione straordinaria Strade	€ 460.000,00		€ 460.000,00	Lavori in corso - certificato di regolare esecuzione previsto entro fine 2020. Con Determinazione Dirigenziale n. 979/2017 è stato approvato il Progetto di "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE E MANUFATTI SUL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2018". Con Determinazione Dirigenziale n. 353/2018 sono stati affidati i lavori, inizio luglio 2018. con Determinazione Dirigenziale n. 915/2019 è stato esteso l'importo contrattuale ed approvato un QTE complessivo di € 688.000. Conseguentemente è stato esteso il cropprogramma lavori e di spesa. Tutti gli interventi sono avviati ed in corso di esecuzione. <b>certificato di regolare esecuzione previsto entro fine 2020</b>
		Movicentro 1 - lotto 2	€ 261.368,00		€ 261.368,00	Intervento concluso. Con Determinazione Dirigenziale n. 1142/2016 è stato approvato il progetto denominato "Opere complementari MOVICENTRO - OPERE COMPLEMENTARI AI LAVORI DI TOMBAMENTO BEALERA BECCHIA E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE". Con Determinazione Dirigenziale n. 28/2018 è stato <b>approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.</b>
		tot.	€ 2.214.016,00		€ 2.214.016,00	
B1-COL		Intervento privato- ricuciture e sicurezza stradale:				
		Urbanizzazioni Leroy Merlin		€ 204.928,00	€ 204.928,00	Intervento <b>concluso</b>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
		Urbanizzazioni fuori ambito Unity		€ 865.490,00	€ 865.490,00	L'intervento non presenta criticità e si presume che i lavori si <b>concluderanno entro il 2020.</b>
		Villaggio Dora - Urbanizzazione - Site		€ 195.500,48	€ 195.500,48	Intervento <b>concluso</b>
		tot.		€ 1.265.918,48	€ 1.265.918,48	
	B2-COL	Intervento comunale - playground	€ 100.000,00		€ 100.000,00	Intervento concluso. Gli interventi sono già stati attuati con due impegni di spesa da € 50.000 approvati con DD. 651/2016 e con DD. 770/2016. Sono state riquilificate le seguenti aree: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campo calcetto Piazza Repubblica</li> <li>• Giardino via Marzabotto a Savonera</li> <li>• Recinzioni Playground Skate Park</li> <li>• Area Fitness Parco Dalla Chiesa</li> </ul> L'intervento è <b>concluso.</b>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B3-COL	intervento comunale - piazze da qualificare	€ 1.008.452,00		€ 1.008.452,00	<p>I lavori sono conclusi, sono in fase di redazione i documenti di collaudo.</p> <p>In data 30 dicembre 2011 veniva sottoscritto il Protocollo di Intesa tra la Città di Torino, la Città di Collegno, Infra.To s.r.l. e GTT S.p.a.;</p> <p>Dato atto che, all'uopo, con deliberazione 4570 del 2017 e deliberazione di Giunta n. 390 del 13/12/2017, rispettivamente il Comune di Torino e il Comune di Collegno hanno approvato idoneo "addendum contrattuale", sottoscritto in data 07/03/2018 REP 9417/U.</p> <p>Constatato, altresì, che con nota prot. n. 71638 del 15/12/2017 il Comune di Collegno, ha segnalato che:</p> <p>"ART 2 - Nel rispetto del parere reso dall'Agenzia delle Entrate in data 21/11/2013 n. 38 E e dell'obiettivo generale Mobilità Sostenibile – progetto MOVicentro (di cui al ciclo di programmazione Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 2000-2006 approvato con Delibera di Giunta Regionale Piemonte n. 1-3024 del 5/12/2011 sulla scorta delle Deliberazioni CIPE 14/2006 e 79/2010) le parti specificano che le somme oggetto di trasferimento sono da considerarsi quale contributo non soggetto al regime IVA ancorché INFRATO SRL non costituisce il beneficiario effettivo delle risorse ma, al contrario, stazione appaltante degli interventi da realizzarsi e, per l'effetto, mero tramite per il trasferimento delle somme di che trattasi a terzi attuatori (che verranno individuati mediante idonee procedure ad evidenza pubblica e i cui rapporti saranno</p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
						<p>normati all'interno di idonei accordi a prestazioni corrispettive passibili di assoggettamento ad IVA)".</p> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 201/2018 è stato approvato il progetto definitivo, trasmesso con nota prot. 60596 del 30/10/2017 dalla Società INFRA.TO S.r.l. denominato "MOVICENTRO 2 - Ampliamento Parcheggio Fermi" redatto nel rispetto degli artt. 23-24 del D.lgs. 50/2016</p> <p>Con Determinazione Dirigenziale n. 689/2018 è stato approvato il progetto esecutivo ed autorizzato Infrato quale soggetto attuatore a pubblicare il bando di gara.</p> <p>Con atto dell'AU n. 50 del 30/07/2018 Infra.To ha preso atto della validazione del progetto esecutivo effettuata dal RUP e ha indetto la procedura aperta n. 05/2018;</p> <p>Il bando è stato pubblicato il 03/08/2018 sulla Gazzetta Italiana e reso disponibile sul sito <a href="http://www.infrato.it">www.infrato.it</a>;</p> <p>Con Determinazione dell'AU n. 70 del 21/11/2018 l'appalto è stato aggiudicato all'ATI Ditta CITRINITI Geom. Massimo (Capogruppo Mandataria) TEAGNO Srl (Mandante).</p> <p>con DD n. 1300/2019 è stata approvata la Perizia di Variante Suppletiva, come da documentazione presentata dalla Società INFRA.TO S.r.l.</p> <p>Con DD. 368/2020 è stato <b>approvato il <u>Certificato di Regolare Esecuzione</u></b> e il Saldo dei trasferimenti.</p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B5-COL	Intervento comunale - recupero spazi pubblici abbandonati	€ 4.027.499,00		€ 4.027.499,00	<p>L'intervento è in corso e non presenta criticità. I lavori dovrebbero concludersi entro il 2022. con Deliberazione di Giunta Comunale n. 238 del 25.07.2018 l'Ente ha approvato il progetto definitivo-esecutivo del LOTTO I B (parte integrante del LOTTO I A di cui alla pregressa DD 220/2018), nonché in linea tecnica il progetto definitivo-esecutivo del LOTTO II, entrambi redatti dallo Studio Associato FRATERNALI - QUATTROCCOLO Architetti (mandatario capogruppo); Ing. BARTOLOZZI ROBERTO PIETRO CANDIDO (mandante); Ing. NEGRI LUCA (mandante); Ing. MATARAZZO PASQUALE (mandante); P.I. MARCON BRUNO (mandante); Dr. Geol. DE RUVO MICHELE (mandante), con sede legale in Torino, Via G. Piazza n. 17, (Partita IVA 07678120010), relativo ai lavori di "REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA PRIMARIA IN VIA VANDALINO ANGOLO VIA ADAMELLO" - Con Determinazione 1486 del 20/12/2018 l'Ente ha approvato il progetto esecutivo dell'opera, aggiornando il quadro tecnico economico, nonché disposto l'avvio della procedura di gara aperta per l'aggiudicazione dei lavori. - Nella Gazzetta Ufficiale del 31/12/2018 è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori. Con Determinazione n. 566/2019 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico: CONSORZIO INTEGRA Società Cooperativa</p>

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
						per aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa. Intervento <b><u>in corso di attuazione.</u></b>
	B5-COL	Intervento privato- recupero spazi pubblici abbandonati:				
		Villaggio Dora - Costo costruzione - SILE		€ 3.390.070,00	€ 3.390.070,00	Intervento <b><u>concluso</u></b>
		Compagnia di San Paolo- edificio Certosa - stirerie.		€ 150.000,00	€ 150.000,00	Intervento <b><u>concluso</u></b>
		PIP - Leroy Merlin		€ 437.059,00	€ 437.059,00	Intervento <b><u>concluso</u></b>
		tot.		€ 3.977.129,00	€ 3.977.129,00	
	D1/2/4-COL	intervento comunale- avvicinare le istituzioni ai cittadini.	€ 277.730,00		€ 277.730,00	Con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del comune di Collegno n. 117/2017 è stato aggiudicato il Servizio per gli anni 2017/2020. Con determinazione del Dirigente del Settore Politiche Sociali del Comune di Collegno n. 91/2020 è stato prorogato il Servizio per il periodo 10/03 - 15/07/2020 e con successiva determinazione dirigenziale n. 621/2020 del medesimo Dirigente il servizio è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2020. Il servizio è tuttora <b><u>in corso.</u></b>
		Un nuovo modello di gestione. Partecipare alla cura degli spazi per ridare la città ai cittadini				
		Intervento comunale- Coesione sociale e sostegno al reddito				
		Intervento privato - Coesione sociale e sostegno al reddito		€ 79.500,00	€ 79.500,00	
Grugliasco	B1-GRU	Intervento privato - Riqualficazione viabilità quartiere ATC		€ 73.000,00	€ 73.000,00	E' in corso la progettazione esecutiva. I lavori verranno realizzati in contemporanea all'intervento pubblico e pertanto, come richiesto nella proroga entro il 09/01/2021

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B2-GRU	Intervento privato - Riquilificazione viabilità borgata Gerbido		€ 3.500.000,00	€ 3.500.000,00	Al fine di perfezionare l'atto di cessione gratuita delle aree al Comune si è reso necessario un approfondimento in merito alle indagini ambientali di caratterizzazione del terreno. Il Comune ha trasmesso in data 24/10/2018 le relazioni occorrenti all'acquisizione del parere propedeutico alla stipula dell'atto alla competente A.R.P.A. Le indagini ambientali sul terreno sono state completate senza evidenziare necessità di interventi di bonifica. Sono in corso i frazionamenti per consentire la cessione gratuita delle aree al Comune di Grugliasco. Successivamente il Comune procederà alla vendita delle aree edificabili destinando gli introiti previsti, stimati in € 3.500.000,00 ad opere di urbanizzazione e di riqualificazione urbana e di spazi pubblici nella stessa Borgata Gerbido. Si stima che il perfezionamento dell'atto di cessione gratuita al comune avverrà con un leggero ritardo rispetto al previsto e comunque <b>entro il 31 dicembre 2020.</b>
Moncalieri	C1-MON	Canale scolmatore	€ 3.918.000,00	€ 2.072.000,00	€ 5.990.000,00	L'intervento è stato affidato all'ATI VALBASENTO LAVORI S.R.L. di Calciano (MT) PA.E.CO S.r.l. di Garguso (MT). E' stata fatta la consegna definitiva dei lavori il 29/08/2019 ed è in corso di esecuzione. Con D.D. n. 946 del 09/06/2020 del è stato approvato il I SAL a tutto il 24/05/2020. Indicativamente la conclusione è da posticiparsi rispetto al previsto e si ipotizza la per il mese di Maggio 2021



Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	E2-MON	Intervento comunale - Adeguamento L. Pirandello	€ 250.000,00		€ 250.000,00	Intervento <b>concluso</b>
Nichelino	E2-NIC	Intervento privato - Biblioteca Arpino		€ 50.000,00	€ 50.000,00	La rifunzionalizzazione complessiva della Biblioteca Civica G. Arpino è subordinata alla ricollocazione della Ludoteca Comunale, ora inserita al piano terra della struttura. Lo spostamento della Ludoteca è stato previsto nei locali comunali dell'ex piscina sita in Nichelino ,Via XXV Aprile (progetto definitivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.148 del 10/09/2019). Determinazione Dirigenziale n.527 del 15/6/2020 Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria inerente la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi previsti presso la Biblioteca G.Arpino. L'intervento per la Biblioteca Civica Arpino verrà concluso entro il termine previsto del 9 novembre <b>2022</b> .
Orbassano	B3-ORB	Realizzazione di spazi pubblici		€ 424.063,00	€ 424.063,00	L'intervento privato, consistente nella realizzazione di spazi pubblici, attualmente risulta non ancora avviato per ragioni attribuibili all'operatore privato. La convenzione urbanistica vale tuttavia fino al 2023 e quindi i lavori dovranno comunque concludersi entro il 2026.
	B4-ORB	Realizzazione di parcheggio		€ 400.000,00	€ 400.000,00	I lavori sono stati ultimati e l'intervento <b>collaudato</b> con D.G.C.n. 56 del 27/05/2020.
Rivoli	B2-RIV	Manutenzione palestra plesso Freinet-Rosselli	€ 57.011,32		€ 57.011,32	Intervento <b>concluso</b> . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 1240 del 06/12/2017.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B4-RIV	Manutenzione palestra plesso Gobetti	€ 66.993,72		€ 66.993,72	intervento <b>concluso</b> . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 272 del 20/03/2019.
	B5-RIV	Adeguamento alle norme di sicurezza scuole Andersen, Makarenko e Don Locanetto	€ 418.581,58		€ 418.581,58	Intervento <b>concluso</b> . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 1300 del 04/12/2018 (2° lotto - scuole Makarenko e don Locanetto) e D.D. n. 631 del 13/06/2019 (1° lotto – scuola Andersen).
	B7-RIV	Rifacimento manti stradali e adeguamento marciapiedi e sottoservizi	€ 965.318,43		€ 965.318,43	Intervento <b>concluso</b> . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 497 del 29/04/2019.
	B8.2-RIV:	Intervento residenziale privato di riplasma tura/riuso di volumetrie preesistenti		€ 2.209.379,74	€ 2.209.379,74	Intervento <b>concluso</b>
	B9-RIV	Intervento privato di ampliamento sede stradale		€ 190.000,00	€ 190.000,00	Intervento <b>concluso</b> . Approvazione C.R.E. con D.D. n. 4 del 13/01/2020
Settimo	B1-SETT.1	Intervento privato - Rifunionalizzazione edifici Stazione Ferroviaria		€ 5.000.000,00	€ 5.000.000,00	Intervento <b>concluso</b>
	B5-SETT	Realizzazione parcheggio area Stazione Ferroviaria	€ 68.000,00		€ 68.000,00	Intervento <b>concluso</b>
	B6-SETT	Nuovo palazzetto dello sport	€ 6.288.000,00		€ 6.288.000,00	l'intervento è in corso. consegnato lavori in data 1/10/2019,emesso sal1, si conferma la previsione di ultimazione lavori <b>per il 31/12/2020</b>
	C1-SETT	Settimo sicura: portali di controllo agli ingressi della Città	€ 50.400,00		€ 50.400,00	Intervento <b>concluso</b>
San Mauro T.se	A1-SAN*	Lavori di riqualificazione dell'area verde di via Del Porto				In attesa approvazione della rimodulazione a favore dell'intervento B1-SAN.
	A2-SAN*	Lavori di riqualificazione di via Mirande				In attesa approvazione della rimodulazione a favore dell'intervento B1-SAN.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	C2-SAN*	Lavori di realizzazione di orti urbani nel distretto urbanistico di Sambuy				In attesa approvazione della rimodulazione a favore dell'intervento B1-SAN.
Venaria	A1-VEN	Riquilificazione e rifunzionalizzazione aree verdi	€ 150.000,00		€ 150.000,00	Intervento <b>concluso</b> . Con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 20/03/2018 è stata approvata la contabilità finale ed il <b>Certificato di regolare esecuzione</b> dei lavori.
	A3-VEN	Riquilificazione facciate degradate nel Centro Storico	€ 510.000,00	€ 170.000,00	€ 680.000,00	L'intervento è <b>in corso</b> , non presenta criticità. Sono in fase di rendicontazione le ultime due richieste di finanziamento. E' in fase di definizione una ulteriore pratica di Piazza Annunziata 6. Si prevede la conclusione nel <b>2020</b> .
	A4-VEN	Recupero e rifunzionalizzazione del comprensorio denominato Ex-Opificio Galleani		€ 3.174.000,00	€ 3.174.000,00	L'intervento è <b>in corso</b> . Sebbene siano state evidenziate dal privato alcune criticità finanziarie dovute alla crisi economica, si prevede che l'intervento si concluderà entro il <b>2021</b> . L'alienazione della proprietà dell'Opificio non risulta ancora definita.
	B1-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali	€ 430.000,00		€ 430.000,00	Con determinazione dirigenziale n. 777 del 10/10/2018 sono stati aggiudicati i lavori. I lavori si sono <b>conclusi</b> in data 26/06/2020. In fase di collaudo.
	B2.2-VEN	Manutenzione e restauro copertura sede comunale di Piazza Martiri della Libertà	€ 235.000,00		€ 235.000,00	L'intervento è in corso. Con determinazione n. 243 del 20/03/2019 sono stati affidati i servizi tecnici per la progettazione. Fine lavori prevista <b>30/09/2020</b> .

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	B4-VEN	Lavori di manutenzione straordinaria, di rifacimento di coperture e di adeguamento prevenzione incendi di edifici scolastici e comunali. fase 3.	€ 930.000,00		€ 930.000,00	L'intervento è in corso (è stato validato il progetto esecutivo). La fine dei lavori è prevista <b>per il 31/08/2020</b> .
	B5-VEN	Manutenzione straordinaria sistema di raccolta e smaltimento acque piovane della copertura della scuola De Amicis	€ 120.000,00		€ 120.000,00	I lavori si sono <b>conclusi</b> in data 20/05/2019, in anticipo di 30 giorni rispetto al cronoprogramma. <b>Collaudo</b> approvato con determinazione n. 712 del 14/10/2019
	D1-VEN	Intervento comunale - Progetto Housing sociale "Cà Buozzi"	€ 57.956,60		€ 57.956,60	Concessa proroga fino al 09/10/2021 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri <b>con nota</b> del 08/11/2019. Si è proceduto all'aggiudicazione della gara alla Cooperativa Animazione Valdocco. E' in corso l'istruttoria per l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto d'appalto. <b>Esecuzione anticipata del contratto.</b>
	E1-VEN	Riqualficazione spazi pubblici e attuazione Zone 30 KM/h	€ 600.000,00		€ 600.000,00	Intervento <b>concluso</b> . Con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 13/03/2018 è stata approvata la contabilità finale ed il <b>Certificato di regolare esecuzione</b> dei lavori.
	E4-VEN	Realizzazione parcheggio nuova struttura sanitaria a regia regionale	€ 1.553.543,54		€ 1.553.543,54	intervento <b>concluso</b> in data 28/05/2020 <b>collaudo</b> emesso in data 08/07/2020
	E5-VEN	Miglioramento della qualità delle fermate del trasporto pubblico locale				L'intervento è in corso e non presenta criticità.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
	E6-VEN	Azioni di sostegno al car sharing, car pooling, bike sharing		€ 12.500,00	€ 12.500,00	L'intervento è <b>in corso</b> . Per il bike sharing nell'ambito del progetto ViVo "Rastrelliere on demand", con l'obiettivo di ridurre l'utilizzo delle autovetture nella zona Ovest di Torino e rendere più agevole l'utilizzo della bicicletta nell'ambito dello sviluppo della mobilità sostenibile, si richiederà al Patto Territoriale Zona Ovest di Torino la fornitura di portabici da installare sul territorio cittadino. Per quanto riguarda il car sharing è intervenuta la risoluzione anticipata, per giusta causa (fallimento società fornitrice), del contratto relativo all'attività di "Io Guido- Car City Club" a partire dal 01/04/2017.
	E7-VEN	Azioni di sostegno allo sviluppo dei mezzi elettrici				L'intervento è <b>in corso</b> e non presenta criticità. Operatore selezionato; sono in corso le procedure di autorizzazione.

Ente attuatore	Cod. Intervento	Titolo intervento	finanziamento pubblico	finanziamento privato	Investimento totale	Stato di avanzamento ed eventuali criticità
Città metropolitana di Torino	D1-CMTO	Cofinanziamento pubblico - Mip al TOP	€ 7.933.200,00		€ 7.933.200,00	<p>Dopo i positivi risultati raggiunti dal Programma Mip nel periodo 2017-2019, la Regione Piemonte ha rifinanziato il Programma con uno stanziamento di risorse aggiuntive, sempre a valere sul Por Fse, per il periodo 2020-2022. Il Programma Mip fino al 31/12/2019 potrà contare su risorse aggiuntive per l'area di Città Metropolitana pari a € 3.988.500, come previsto nella rimodulazione presentata.</p> <p>Le attività del Programma Mip relative al biennio 2016-2018 si sono concluse. Sono in fase di ultimazione le procedure amministrative per l'avvio delle attività del biennio 2020-2022. L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha rallentato l'ultimazione delle procedure amministrative di avvio delle attività 2020-2022; che potranno riprendere a pieno regime da settembre 2020.</p> <p>Le attività del Programma Mip sono state rifinanziate per il periodo 2019-2022 ; vista la situazione emergenziale in corso, è in fase di predisposizione una richiesta di proroga.</p>

\* La tabella riporta già (privi dei dati economici) gli interventi per i quali la richiesta di rimodulazione trasmessa ne prevede la realizzazione con fondi comunali.
