

Esecuzione Piano di Sorveglianza sanitaria

**Coordinamento con le tempistiche di
attivazione dell'impianto**



Premesse - 1

In data **2 maggio 2013** venivano concluse – con 1 giorno di anticipo rispetto al periodo di 15 giorni - le **prove di avvio della Linea 1** causa guasto tecnico.

In data **2 maggio 2013** i membri del **Comitato Tecnico Scientifico** chiedevano alla Provincia di Torino **informazione** sulla strategia e sugli aspetti operativi legati da una parte alle **prime prove** svolte dall'impianto del Gerbido e dall'altra alla **tempistica di raccolta dei campioni biologici** dei residenti in prossimità dell'impianto prima dell'avvio dell'esercizio del medesimo.

In data **3 maggio 2013** la Provincia di Torino chiedeva di **sospendere le attività per l'inizio della fase di gestione della Linea 1** convocando una riunione per il successivo 6 maggio

Premesse - 2

In data **6 maggio 2013** in occasione di tale incontro TRM confermava che l'impianto non era in funzione e che si stava procedendo alle attività di ripristino che si sarebbero completate entro alcuni giorni.

In data **9 maggio 2013** la Provincia di Torino - rappresentando l'esigenza di effettuare la prima fase di prelievo biologico sulla popolazione a impianto non attivo – chiedeva di:

- non avviare la fase di gestione della Linea 1
- dare corso esclusivamente alle prove di avvio della Linea 2
- comunicare con congruo anticipo la possibilità di inizio prove della Linea 2

Ipotesi - Descrizione

In data **9 maggio 2013** TRM, prendendo atto della richiesta di non avviare la fase di gestione della Linea 1, comunicava che le attività di verifica e controlli erano concluse e che l'impianto **potrà entrare in funzione** dal prossimo venerdì 10 maggio (**Ipotesi 1**) e comunque entro lunedì 20 maggio (**Ipotesi 2**).


A seguito di 15 giorni di prove di avviamento, verrà rispettato il richiesto **fermo impianto della durata di 5 giorni** per consentire la prima fase di prelievi biologici a **impianto non attivo**.

Successivamente, verranno **avviate**


- la fase di esercizio per le Linee 1 e 2
- le prove di avvio della Linea 3

per poter garantire per il mese di giugno gli impegni di programmazione dei flussi previsti nel Piano d'Ambito.


Ipotesi 1 - Tempistiche

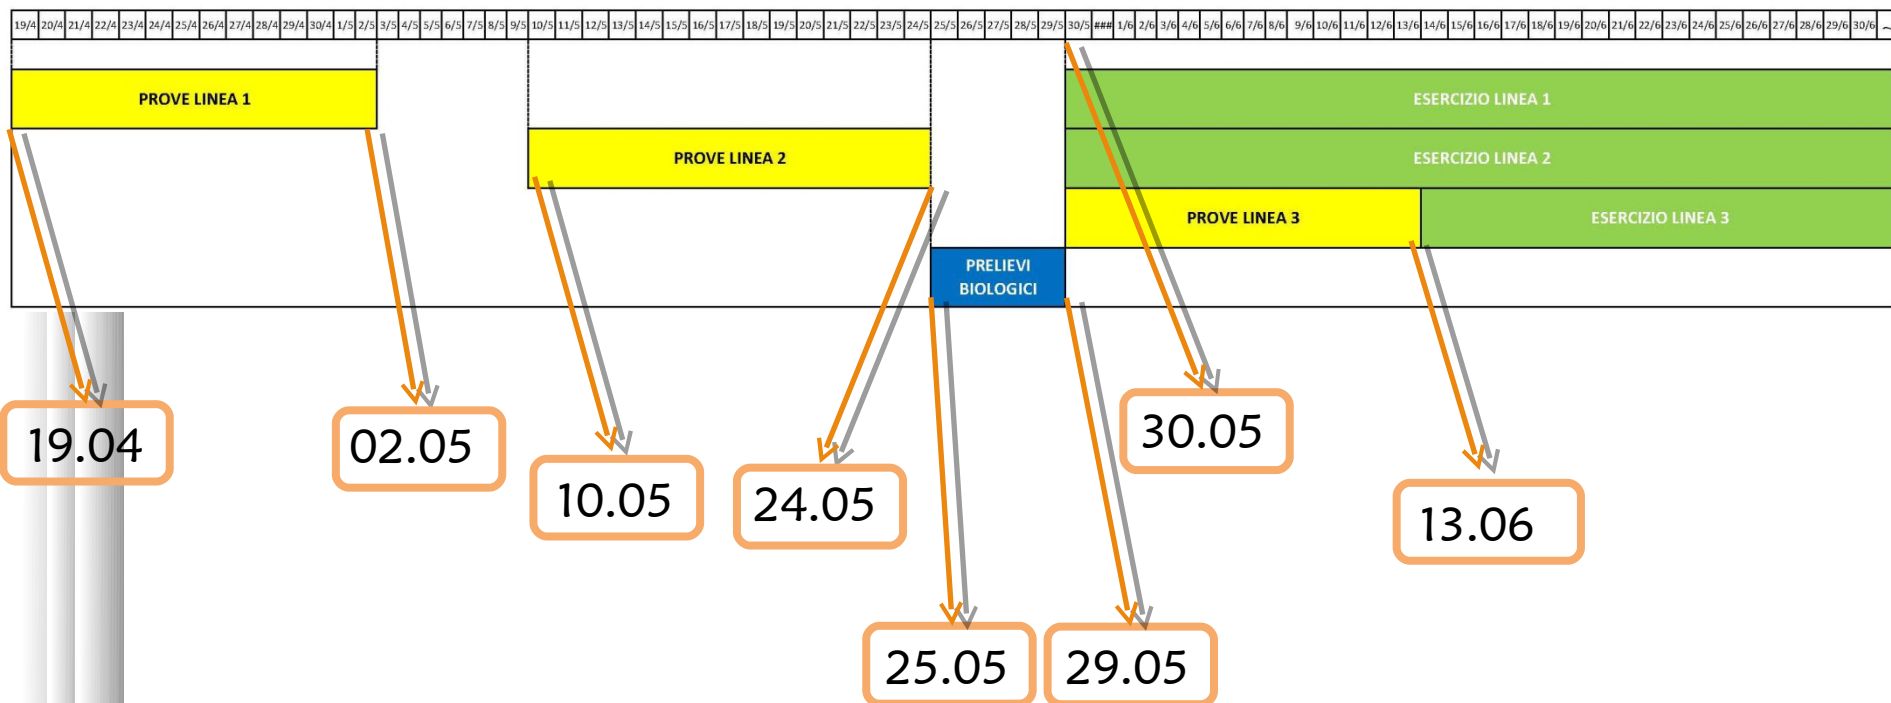

Ipotesi 2 - Tempistiche

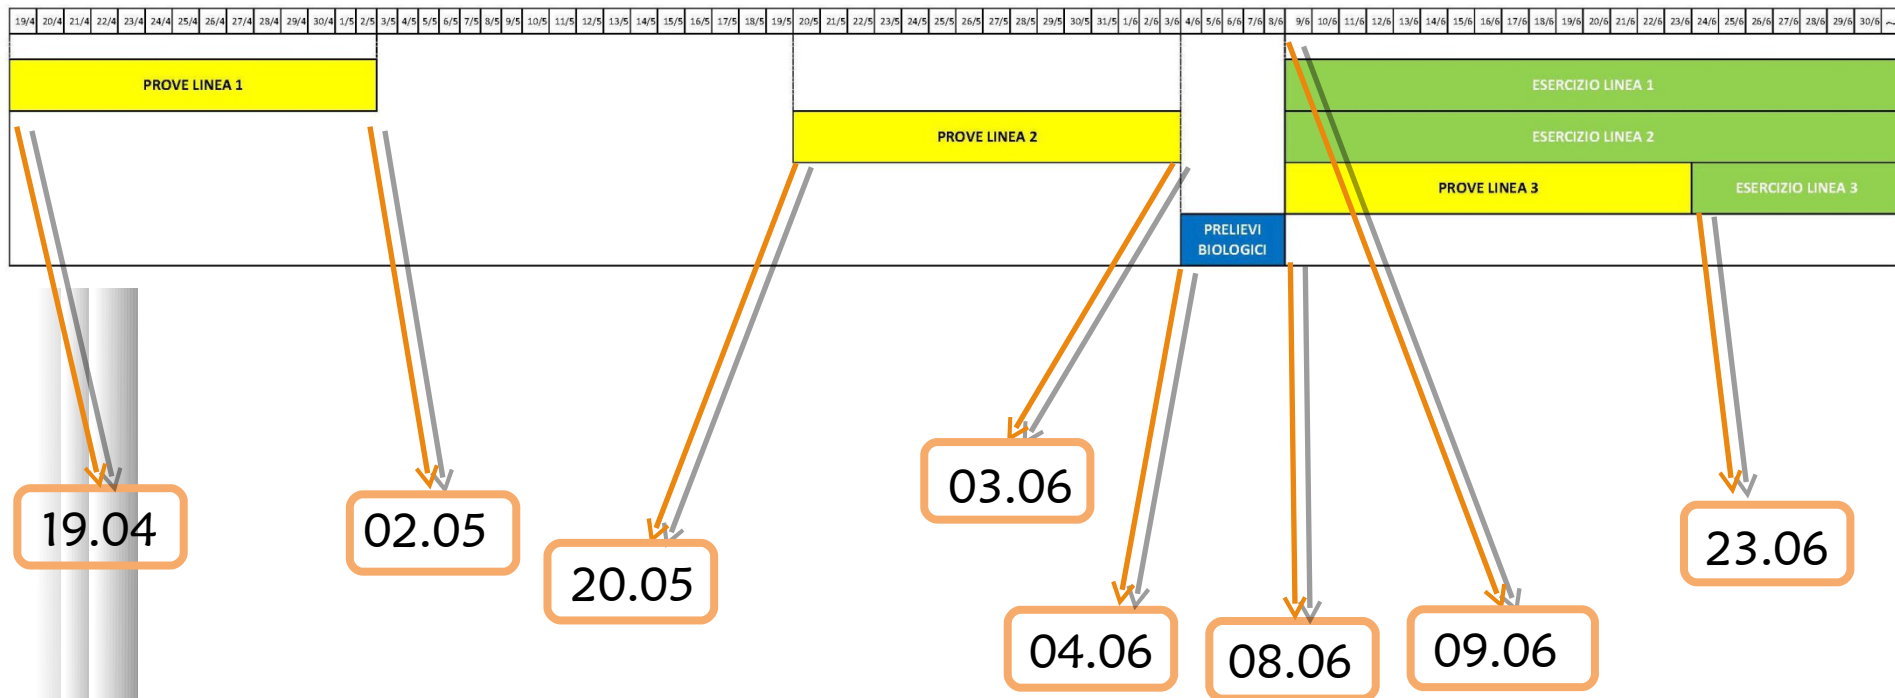

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



www.trm.to.it

© TUTTE LE INFORMAZIONI CONTENUTE E ALLEGATE A QUESTO DOCUMENTO SONO DI PROPRIETÀ DI TRM SPA.

LA TRM DIFFIDA DAL RIPRODURRE E TRASMETTERNE INTERAMENTE O IN PARTE IL CONTENUTO, FATTE SALVE LE

EVENTUALI SPECIFICHE AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DA TRM STESSA.
